

Lettre Info Chantier

n°03

Été 2018- Juillet/Août 2018

Chantier Tour HEKLA



Fin des travaux préparatoires. Les fondations de la tour Hekla vont démarrer.

La fin de ces travaux préparatoires permet le démarrage des travaux de fondation de la tour. Ces travaux consistent dans un premier temps à la réalisation d'une paroi moulée (mur en béton armé coulé dans le sol). Cette paroi sera réalisée à l'aide d'un procédé appelé « Hydrofraise » qui permet de limiter les vibrations et nuisances sonores. Les nuisances sonores ne seront pas évitées, mais elles seront cependant limitées par rapport à d'autres procédés constructifs.

Bennes Hydrauliques & Hydrofraise

L'hydrofraise est un procédé innovant permettant de réduire la durée de forage même dans des terrains « durs ».


Lettre Info Chantier

Fin des travaux de la base vie

Les fondations de la base vie se terminent durant le mois d'août. Les bungalows de la base vie accueilleront les bureaux de chantier et les réfectoires pour le personnel durant la construction de la tour. La fin des travaux pour la première phase de la base vie est prévue pour fin octobre. La deuxième phase du montage interviendra en avril 2020.

Après les fondations, il sera nécessaire de mettre en place une charpente métallique sur laquelle reposeront les bungalows de la base vie. La fermeture de la route de la demi-lune est indispensable lors des opérations de montage de la charpente et de la pose des bungalows.

Dans ce cadre, afin de limiter l'impact sur le trafic, nous allons fermer la route de la Demi-lune de 22h à 5h du matin du 27/08/2018 au 19/10/2018.

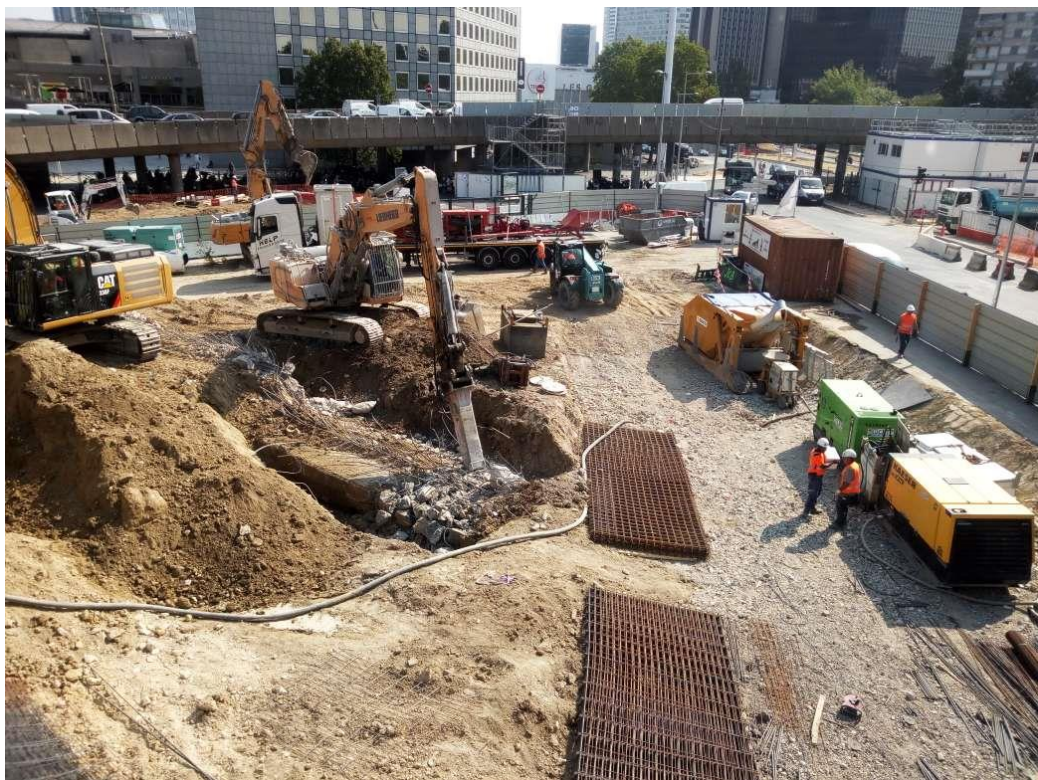

Fin de la démolition des ouvrages existants pour laisser place aux fondations de la tour

Lettre Info Chantier

Un encadrant de Vinci Construction France sera joignable en cas de besoin sur les horaires d'ouverture de chantier.

Numéro vert à composer : **0800 943 091**

Mail de contact :
contact.hekla@vinci-construction.fr

